RISK CHECKLIST

STT	RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN KĨ THUẬT - THI CÔNG	✓
1	Lựa chọn biện pháp, công nghệ thi công không phù hợp	
2	Sai sót trong địa chất công trình	
3	Thi công sai thiết kế phải làm lại	
4	Kĩ thuật thi công phức tạp	
5	Chất lượng vật liệu xây dựng kém	
6	Quản lý tổ chức thi công của nhà thầu kém	
7	Tổ chức mặt bằng công trường chưa hợp lý	
8	Vận hành, sử dụng máy móc, thiết bị gặp sự cố, hư hỏng	
9	Trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị không phù hợp với điều kiện thực tế công trường	
10	Chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng thi công	
11	Chậm trễ trong việc cung ứng vật tư, máy móc	
12	Chậm trễ trong phê duyệt hồ sơ, bản vẽ	
13	Chậm trễ trong giải quyết mâu thuẫn giữa các bên tham gia dự án	
14	Lập tiến độ thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thực tế	
15	Tranh chấp và đình công ảnh hưởng tiến độ	
16	Thiếu sự phối hợp giữa các bên tham gia dự án	
STT	RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ- TÀI CHÍNH	✓
17	Năng lực tài chính của Chủ đầu tư	
18	Chậm trễ thanh toán hợp đồng/ định kỳ	
19	Giá trị khối lượng công việc đã thực hiện được duyệt không được thanh toán hết	

RISK CHECKLIST

STT	RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ- TÀI CHÍNH	✓
20	Năng lực tài chính của Nhà thầu	
21	Năng lực tài chính của Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ	
22	Trượt giá do thời gian thi công kéo dài	
23	Lạm phát tăng	
24	Khủng hoảng tài chính	
STT	**RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LÝ - HỢP ĐỒNG**	✓
25	Khối lượng công việc thực tế cao hơn khối lượng hợp đồng (Hợp đồng trọn gói).	
26	Chậm trễ trong việc xin/cấp giấy phép xây dựng.	
27	Điều kiện thi công thực tế khác với hợp đồng.	
28	Sự cấu kết gian lận giữa các bên tham gia dự án.	
29	Chủ đầu tư thường xuyên thay đổi phạm vi công việc trong hợp đồng.	
30	Các điều khoản hợp đồng không rõ ràng.	
31	Không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng	
STT	**RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ**	✓
32	Yêu cầu thay đổi thiết kế phát hành trong thời gian quá ngắn.	
33	Thường xuyên thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.	
34	Xung đột giữa các bản vẽ thiết kế (Kiến trúc, Kết cấu, MEP).	
35	Thiết kế phức tạp.	
36	Bản vẽ thiết kế không đầy đủ.	
37	Phát hành thiết kế chậm trễ.	

RISK CHECKLIST

STT	RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ	✓
38	Năng lực của các đơn vị thiết kế không đáp ứng	
STT	**RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - AN TOÀN - XÃ HỘI**	✓
39	Năng suất lao động thấp.	
40	Thiếu hụt lao động thủ công.	
41	Không có sẵn lực lượng lao động tay nghề cao (Giám sát, lao động qua đào tạo).	
42	Thời tiết thất thường (mưa, bão, nắng gắt...) ảnh hưởng đến tiến độ thi công.	
43	Địa chất công trình phức tạp phải dừng thi công để xử lý.	
44	Các sự cố bất khả kháng (dịch bệnh, thiên tai vượt quá dự tính của con người).	
45	Tai nạn lao động, sự cố cháy nổ...	
46	Không có sự đồng thuận của cộng đồng, xã hội khi thi công dự án.	
47	Điều kiện an toàn vệ sinh lao động không được đảm bảo.	

NGUỒN THAM KHẢO: https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso/bitstream/DLU123456789/270000/1/CVv187S1-22021073.pdf

CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO

ISIKAWA DIAGRAM (FISH BONE DIAGRAM)

Biểu đồ xương cá là một công cụ giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của một khiếm khuyết, biến thể, lỗi của một quy trình nào đó. Biểu đồ này có hình dạng giống như một chiếc xương cá, với phần đầu là vấn đề cần giải quyết, các xương nhỏ hơn là những nguyên nhân của vấn đề.

BIỂU ĐỒ XƯƠNG CÁ

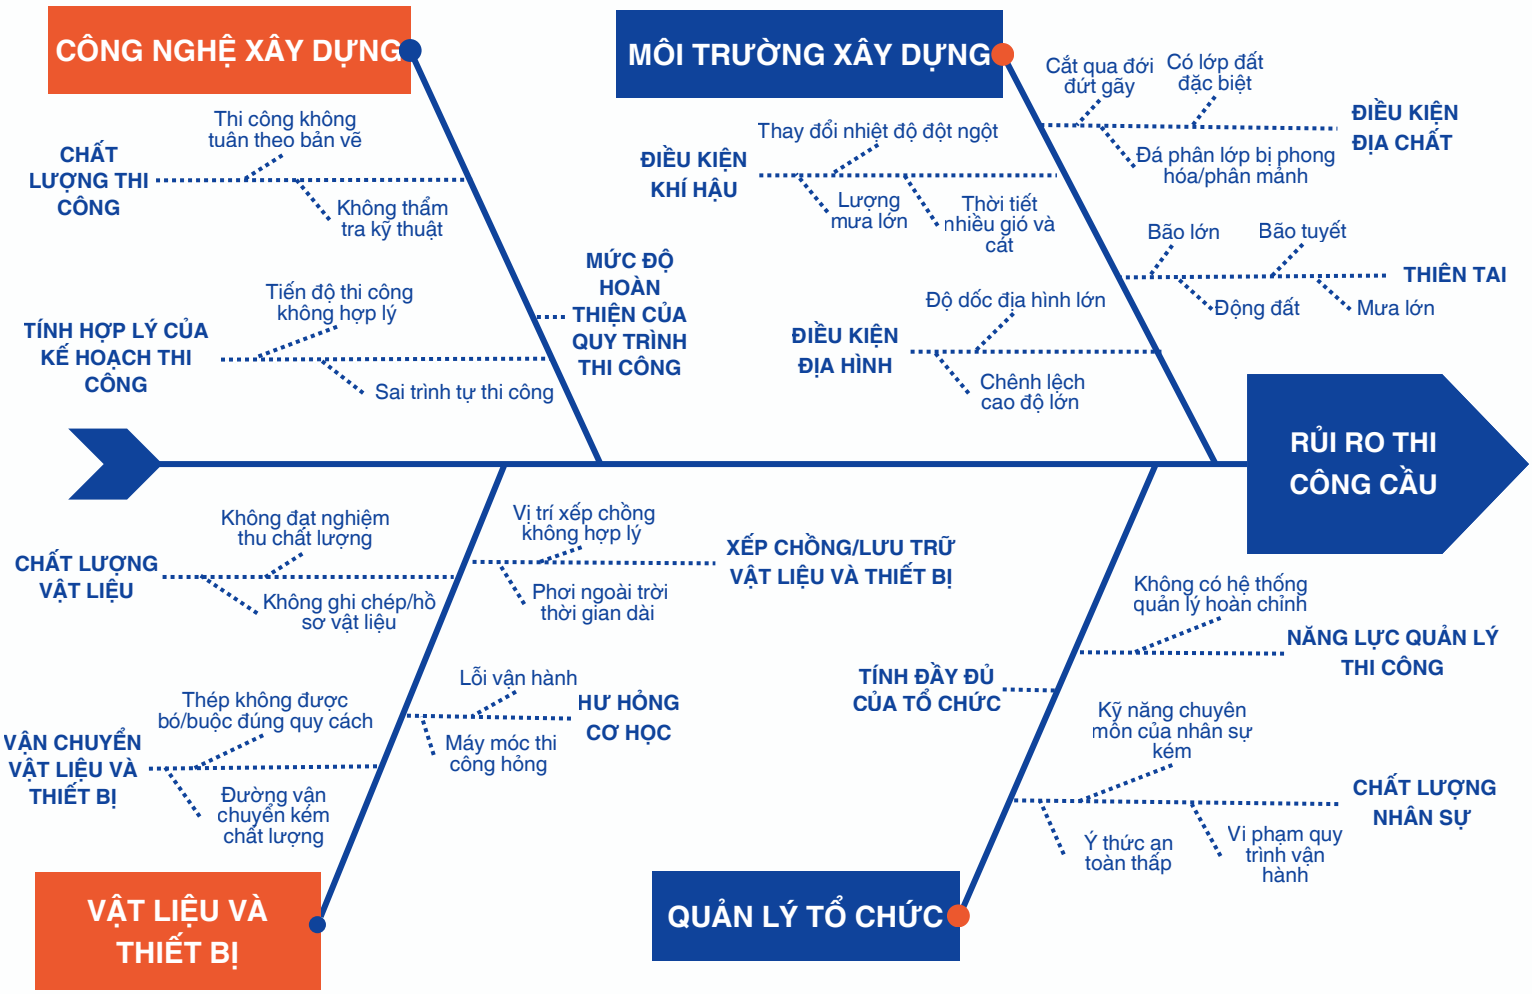

NGUỒN THAM KHẢO: https://www.mdpi.com/2075-5309/14/3/576

CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO

MA TRẬN SWOT

Ma trận SWOT là một trong những phương pháp cần nắm vững để quản lý rủi ro. SWOT bao gồm việc phân tích điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats). Phương pháp này bắt đầu bằng việc phân tích nội bộ nhằm xác định các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Sau đó, bối cảnh bên ngoài được phân tích để xác định các cơ hội và thách thức.

SWOT

DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG
15 TẦNG

STRENGTHS – ĐIỂM MẠNH

- Chủ đầu tư có năng lực tài chính ổn định.
- Nhà thầu chính có kinh nghiệm thi công nhiều dự án tương tự.
- Đội ngũ kỹ sư và giám sát có chuyên môn cao.
- Hồ sơ thiết kế và dự toán được chuẩn bị đầy đủ.
- Quy trình quản lý an toàn lao động được áp dụng nghiêm ngặt.

S

WEAKNESSES – ĐIỂM YẾU

W

- Phụ thuộc vào một số nhà cung cấp vật liệu chính.
- Kinh nghiệm quản lý hợp đồng phụ còn hạn chế.
- Năng lực phối hợp giữa các bên (chủ đầu tư - tư vấn - nhà thầu) chưa đồng bộ.
- Dự toán có thể chưa tính hết yếu tố biến động giá.

O

- Thị trường bất động sản đang tăng trưởng.
- Chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng của Nhà nước.
- Ứng dụng công nghệ xây dựng mới (BIM, vật liệu xanh).
- Nguồn lao động xây dựng dồi dào.
- Hệ thống giao thông khu vực dự án được nâng cấp.

OPPORTUNITIES – CƠ HỘI

T

- Biến động giá vật liệu xây dựng (xi măng, thép).
- Điều kiện thời tiết bất lợi (mưa bão kéo dài).
- Thay đổi quy định pháp lý, giấy phép xây dựng.
- Nguy cơ tai nạn lao động.
- Rủi ro chậm giải ngân hoặc thay đổi nhu cầu thị trường.

THREATS – THÁCH THỨC
